Harmonogram prací - aktualizace k 13.2.2017

Vodovod Bohatice
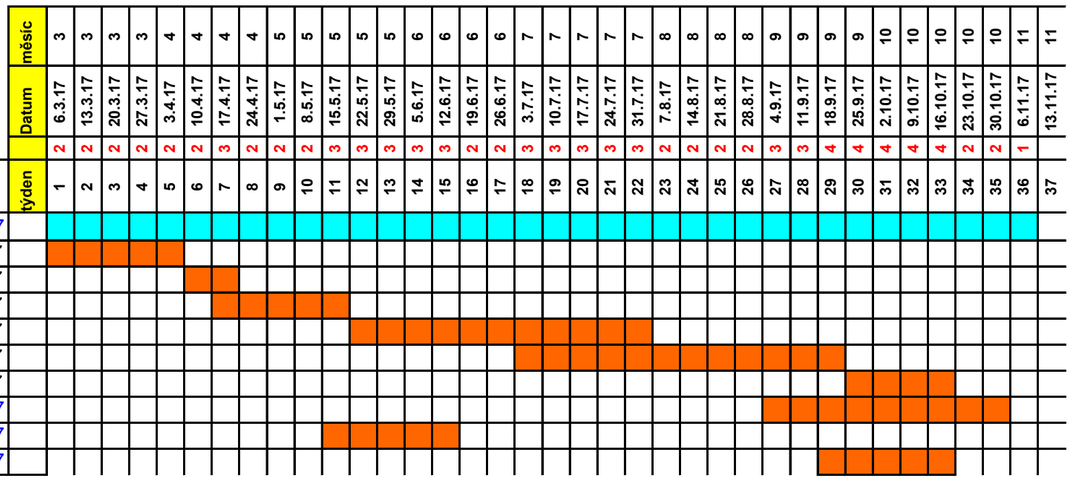
číslo	technologcký postup prací	dny	týdny	zahájení	ukončení
	doba výstavby - předání a převzetí staveniště	250	*36*	6.3.17	10.11.17
1	PŘÍPRAVA -VYTYČENÍ, DIR DIO, PROVOZOVATEL, DOD. MAT.	*30*	*4*	*6.3.17*	*5.4.17*
2	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	*10*	*1*	*10.4.17*	*20.4.17*
3	Přívodní řad P1 1797 m	*30*	*4*	*17.4.17*	*17.5.17*
4	ZÁSOBNÍ ŘADY rozvody po obci 3640 m	*80*	*11*	*17.5.17*	*5.8.17*
5	Přípojky	*80*	*11*	*3.7.17*	*21.9.17*
6	komunikace	*25*	*4*	*21.9.17*	*16.10.17*
7	uvedení dotčených pozemků do původního stavu	*56*	*8*	4.9.17	30.10.17
8	ATS	*30*	*4*	15.5.17	14.6.17
9	REVIZE ZKOUŠKY DOKUMENTACE	*30*	*4*	18.9.17	18.10.17
